



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN REMBANG

SIVIT26

PANDUAN LENGKAP

Petunjuk Penggunaan SIVIT26 2026

Panduan terpisah sesuai peran SEKOLAH dan DINAS, mulai dari pendaftaran sampai pelaporan progres dan monitoring.

Pilih peran Anda

PDF ini memiliki navigasi internal. Klik tombol di bawah untuk langsung menuju panduan peran.

Yang tersedia

SEKOLAH

Daftar akun → Tim Teknis → Paket/PAGU → Laporan mingguan → Kurva S/GIS.

DINAS

Verifikasi akun → Tim Teknis → PAGU → Laporan → Monitoring.

Buka Panduan SEKOLAH

Buka Panduan DINAS

Daftar Isi Interaktif

Klik bagian yang ingin dibuka. Gunakan tautan "Kembali ke daftar isi" pada akhir setiap bab.

1

Alur ringkas

Peta proses dari daftar sampai laporan mingguan.

2

Pendaftaran akun

NPSN, autofill nama sekolah, password, status pengajuan.

3

Login & Tim Teknis

Masuk pertama kali dan melengkapi Perencana/Pengawas.

4

Paket pekerjaan

Menu pekerjaan, PAGU usulan, jadwal, dan status.

5

Persetujuan PAGU

Apa yang terjadi saat disetujui atau ditolak.

6

Laporan progres

Minggu, fisik, anggaran, foto EXIF dan koordinat.

7

Aturan mingguan & revisi

Urutan minggu, duplikasi, batas durasi, progres.

8

Kurva S & GIS

Membaca grafik dan peta interaktif.

9

Masalah umum

Pesan error dan tindakan yang perlu dilakukan.


10

Checklist mingguan

Daftar periksa sebelum mengirim laporan.

1 Alur penggunaan untuk SEKOLAH

Ikuti urutan berikut. Paket pekerjaan hanya dapat dipakai untuk laporan setelah PAGU disetujui DINAS, dan laporan minggu berikutnya menunggu persetujuan minggu sebelumnya.

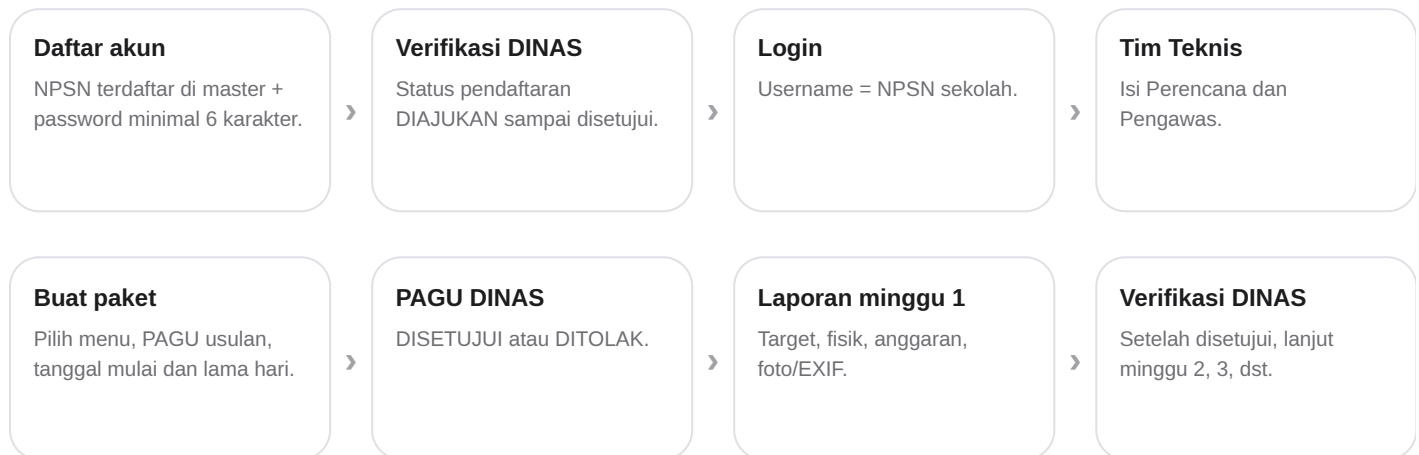

Prinsip penting

NPSN menjadi identitas utama sekolah. Paket ID, status PAGU, PAGU disetujui, status laporan, tanggal upload, dan metadata tertentu dikelola sistem/backend dan tidak perlu diketik manual.

Status yang akan sering terlihat

- DIAJUKAN** menunggu tindakan DINAS.
- DISETUJUI** dapat dipakai ke tahap berikutnya.
- DITOLAK** perlu diperbaiki/diajukan ulang.

Sebelum memulai

- Pastikan NPSN sekolah benar.
- Gunakan browser modern dan koneksi stabil.
- Siapkan nama Perencana dan Pengawas.
- Aktifkan lokasi kamera bila ingin GPS tersimpan pada EXIF foto.

2 Pendaftaran akun sekolah

SIVIT26
Pemantauan Revitalisasi SD
Kabupaten Rembang 2026

[Daftar](#) • [Verifikasi](#) • [Pantau](#)

Satu alur kerja untuk sekolah dan DINAS
Pendaftaran akun, paket pekerjaan, laporan mingguan, Kurva S, dokumentasi foto, dan peta GIS.

SIVIT26
Akun Sekolah

Masuk **Daftar Sekolah**

NPSN SEKOLAH (ID UTAMA) 1
20316041

NAMA SEKOLAH (AUTOFILL) 2
SD NEGERI JAMBANGAN

PASSWORD AKUN 3
.....

Kirim Pendaftaran 4

Tampilan pendaftaran sekolah dengan data contoh. Nomor biru dapat digunakan sebagai panduan urutan.

1 • NPSN

2 • Nama sekolah

3 • Password

4 • Kirim

1 Masukkan NPSN resmi sekolah

Sistem memeriksa NPSN terhadap master sekolah. Jika NPSN tidak ada pada master, pendaftaran dihentikan.

2 Pastikan nama sekolah terisi otomatis

Nama sekolah diambil dari master DINAS, bukan dari input bebas pengguna. Bila tidak muncul, periksa NPSN.

3 Buat password minimal 6 karakter

Gunakan password yang mudah diingat oleh operator resmi sekolah tetapi tidak mudah ditebak pihak lain.

4 Klik Kirim Pendaftaran

Pendaftaran disimpan dengan status **DIAJUKAN** dan DINAS menerima notifikasi verifikasi.

Jika pernah ditolak

Pendaftaran NPSN yang berstatus DITOLAK dapat diajukan kembali. Sistem memperbarui pengajuan yang lama menjadi DIAJUKAN.

3 Login pertama & lengkapi Tim Teknis

Login

1. Buka tab **Masuk**.
2. Isi **NPSN / Username** dengan NPSN sekolah.
3. Isi password yang dibuat saat pendaftaran.
4. Klik **Masuk Sistem**.

Login baru dapat digunakan setelah pendaftaran disetujui DINAS.

Setelah login

Jika Perencana atau Pengawas masih kosong, aplikasi mengarahkan sekolah ke menu **Profil & Tim Teknis**. Lengkapi keduanya sebelum membuat paket pekerjaan.

Menu Profil & Tim Teknis. NPSN/identitas akun bersifat read-only; Perencana dan Pengawas diisi sekolah.

1 • Perencana

2 • Pengawas

3 • Simpan

1 Isi Perencana

Masukkan nama personel/tim perencana yang ditetapkan untuk pekerjaan sekolah.

2 Isi Pengawas

Masukkan nama pengawas yang akan memantau pelaksanaan pekerjaan.

3 Simpan

Data Perencana/Pengawas kemudian dipakai otomatis pada paket pekerjaan.

3B Pastikan status profil siap sebelum membuat paket

Catatan versi backend saat ini

Saat SEKOLAH menyimpan Profil & Tim Teknis, backend menandai status profil menjadi

DIAJUKAN

, sedangkan pembuatan paket mensyaratkan profil berstatus

DISETUJUI

. Karena itu, bila paket menampilkan pesan "Profil & Tim Teknis sekolah belum disetujui oleh DINAS", minta DINAS memastikan status profil telah disetujui sebelum melanjutkan.

Simpan Tim Teknis

Perencana & Pengawas lengkap.



Status profil

Dapat menjadi DIAJUKAN pada backend saat ini.



Konfirmasi DINAS

Pastikan status DISETUJUI.



Buat Paket

Lanjut setelah profil siap.

SOP sementara

Jadikan langkah ini sebagai pemeriksaan operasional sampai aplikasi menyediakan kontrol persetujuan profil yang eksplisit di frontend.

4 Membuat paket pekerjaan

SIVIT26 Kabupaten Rembang 2026

Paket Pekerjaan Saya SEKOLAH

Tambah Paket Pekerjaan

Paket baru akan berstatus DIAJUKAN sampai PAGU disetujui DINAS.

PAKET ID	NPSN	STATUS PAGU
PKT-20316041-1790989701	20316041	DIAJUKAN

NAMA MENU PEKERJAAN	PAGU USULAN
Rehabilitasi Ruang Kelas	1.250.000.000

Isi nominal usulan; PAGU disahkan oleh DINAS.

TANGGAL MULAI	LAMA HARI	TANGGAL SELESAI
05/10/2026	90	02/01/2027

PERENCANA	PENGAWAS
Budi Santoso, S.T.	Siti Rahmawati, S.T.

Simpan Paket

Form paket pekerjaan dengan data contoh. Paket ID, NPSN, status, PAGU disetujui, Perencana dan Pengawas dikelola/diisi otomatis.

1 • Menu pekerjaan 2 • PAGU usulan 3 • Jadwal 4 • Simpan

1 Pilih Nama Menu Pekerjaan

Pilih dari daftar menu pekerjaan yang disediakan sistem. Untuk satu sekolah, nama menu yang sama tidak boleh diajukan dua kali.

2 Isi PAGU USULAN

Masukkan nilai usulan. Kolom PAGU disetujui masih Rp0 sampai DINAS menyetujui usulan.

3 Isi Tanggal Mulai & Lama Hari

Tanggal selesai dihitung otomatis. Lama hari harus bilangan bulat lebih dari 0 dan tanggal selesai tidak boleh lebih awal dari tanggal mulai.

4 Simpan Paket

Paket baru disimpan dengan status PAGU **DIAJUKAN** dan DINAS menerima notifikasi.

Saat revisi paket

Setelah paket sudah ada, frontend/backend mengunci field paket selain

PAGU USULAN

untuk akun SEKOLAH. Jika PAGU usulan berubah, status kembali DIAJUKAN untuk diverifikasi DINAS.

5

Menunggu dan menindaklanjuti persetujuan PAGU

DIAJUKAN

Menunggu DINAS

Belum dapat dipakai untuk membuat laporan progres.

DISETUJUI

PAGU aktif

PAGU disetujui menjadi batas maksimum penggunaan anggaran pada laporan progres.

DITOLAK

Perlu revisi

Revisi PAGU USULAN lalu ajukan kembali. Riwayat perubahan PAGU tetap dicatat sistem.

Apa yang harus dilakukan SEKOLAH?

KONDISI	TINDAKAN	HASIL
PAGU masih DIAJUKAN	Tunggu keputusan DINAS dan pantau notifikasi.	Belum dapat membuat laporan untuk paket tersebut.
PAGU DISETUJUI	Buka Laporan Progres Fisik.	Paket muncul sebagai paket valid untuk pelaporan.
PAGU DITOLAK	Edit paket; ubah PAGU USULAN.	Status dikirim kembali menjadi DIAJUKAN.

Riwayat PAGU

Setiap pengajuan/revisi dan keputusan DINAS dicatat pada riwayat PAGU. Gunakan tombol Riwayat pada tabel paket untuk melihat jejak perubahan.

6

Membuat laporan progres pekerjaan

SIVIT26
Kabupaten Rembang 2026

Laporan Progres Fisik

SEKOLAH

Profil & Tim Teknis

Paket Pekerjaan Saya

Laporan Progres Fisik

Kurva S & Grafik

Peta Persebaran (GIS)

Petunjuk Penggunaan

Tambah Laporan Progres Mingguan
Gunakan paket yang PAGU-nya sudah DISETUJUI.

PAKET PEKERJAAN: PKT-20316041-1790989701 — Rehabilitasi Ruang Kelas

MINGGU KE: Minggu 2 • 12/10/2026 - 18/10/2026

TANGGAL LAPOR: 18/10/2026

TARGET KURVA S: 18.00 %

REALISASI FISIK: 17.50 %

PENGUNAAN ANGGARAN: Rp. 210.000.000

STATUS VERIFIKASI: DIAJUKAN

Foto Dokumentasi

Pilih / Ambil Foto

EXIF: 18/10/2026 09:42 • GPS: -6.70612, 111.34522

Jika GPS EXIF tidak ada, aplikasi menampilkan input koordinat manual.

Kirim Laporan

Form laporan progres mingguan. Status dan metadata tertentu diisi otomatis oleh sistem.

1 • Pilih paket

2 • Minggu

3 • Fisik

4 • Foto EXIF

5 • Kirim

1 Pilih paket yang sudah DISETUJUI

Backend menolak laporan untuk paket yang belum DISETUJUI atau PAGU-nya tidak valid.

2 Pilih minggu pelaporan

Opsi minggu dihitung dari tanggal mulai sampai tanggal selesai paket. Minggu tidak boleh melampaui durasi paket.

3 Isi target, realisasi fisik, dan penggunaan anggaran

Target dan realisasi 0-100%. Penggunaan anggaran tidak boleh negatif dan tidak boleh melebihi PAGU disetujui.

4 Unggah/ambil foto dokumentasi

Aplikasi membaca waktu pengambilan dan GPS dari metadata EXIF. Jika GPS tidak ada, aplikasi menyediakan input koordinat manual.

5 Kirim laporan

Laporan disimpan dengan status **DIAJUKAN**. DINAS menerima notifikasi untuk verifikasi.


7

Aturan penting laporan mingguan


ATURAN	PENJELASAN PRAKTIS
Urutan minggu	Laporan minggu ke-2 baru dapat diajukan setelah laporan minggu ke-1 berstatus DISETUJUI; pola yang sama berlaku untuk minggu berikutnya.
Satu paket + satu minggu	Tidak boleh ada dua laporan berbeda untuk paket dan minggu yang sama. Gunakan fitur revisi/edit pada laporan yang sudah ada.
Batas durasi	Minggu ke tidak boleh melebihi jumlah minggu yang dihitung dari tanggal mulai/tanggal selesai atau lama hari paket.
Progres fisik	Realisasi fisik tidak boleh turun dari minggu sebelumnya tanpa catatan pekerjaan yang menjelaskan revisi.
Laporan revisi	Paket ID dan minggu ke tidak boleh diubah pada laporan yang sedang direvisi.
Status kirim ulang	Saat laporan disimpan/revisi oleh SEKOLAH, status verifikasi kembali menjadi DIAJUKAN dan catatan DINAS dikosongkan untuk siklus verifikasi baru.

Catatan pekerjaan
Pada backend saat ini, kolom **catatan_pekerjaan** untuk laporan dikendalikan DINAS. SEKOLAH tidak dapat mengisinya melalui form umum. Bila ada kebutuhan koreksi progres fisik yang menurun, koordinasikan dengan DINAS agar catatan pekerjaan tersedia.

Contoh urutan yang benar



Memantau Kurva S

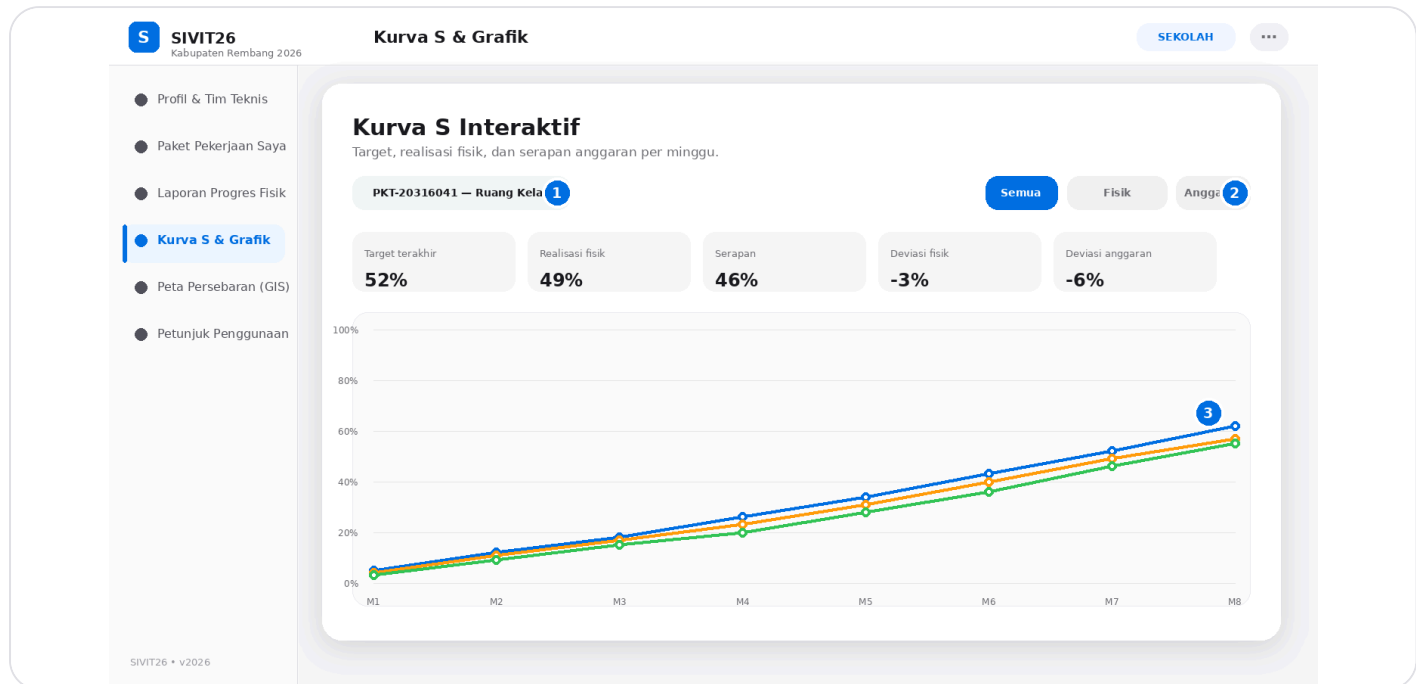

Kurva S interaktif SIVIT26 Premium V3. Pilih paket, fokus seri, dan baca tooltip pada titik mingguan.

1 • Pilih paket

2 • Fokus seri

3 • Tooltip

Kurva S

- **Target Kurva S** = baseline target.
- **Realisasi Fisik** = capaian lapangan.
- **Realisasi Anggaran** = penggunaan anggaran / PAGU disetujui.
- Gunakan mode Semua / Fisik / Anggaran untuk fokus analisis.

Interpretasi cepat

Deviasi = realisasi - target. Nilai negatif berarti realisasi tertinggal dari target; nilai positif berarti berada di atas target.

Pilih satu paket agar data beberapa paket tidak tercampur.

8B

Memantau Peta GIS

SIVIT26
Kabupaten Rembang 2026

Peta Persebaran (GIS)

Peta GIS Interaktif
Lokasi laporan berdasarkan koordinat foto dokumentasi.

CARI SEKOLAH / NPSN

20316041

Semua Disetujui Diajukan Ditolak Semua Titik

SD Jambangan SD Gunungmulyo SD Tlogotunggal SD Manggar SD NEGERI JAMBANGAN SD Sriombo

SD NEGERI JAMBANGAN
NPSN 20316041
Minggu terakhir 2
Realisasi fisik 17.5%
Status DIAJUKAN

SIVIT26 • v2026

Peta GIS V3: pencarian, filter status, marker berwarna, popup progres, dan tombol semua titik.

1 • Cari

2 • Filter

3 • Marker

4 • Popup

Pencarian & filter

Cari berdasarkan NPSN/nama sekolah dan saring status laporan untuk memfokuskan titik.

Tombol Semua Titik mengembalikan cakupan peta ke seluruh marker yang tersedia.

Popup lokasi

Klik marker untuk melihat sekolah, minggu terakhir, realisasi fisik, dan status verifikasi.

Marker hanya tersedia bila koordinat laporan valid.

9

Pesan yang umum muncul dan solusinya

PESAN / KONDISI	PENYEBAB	TINDAKAN
NPSN tidak terdaftar pada master	NPSN belum ada/berbeda pada master sekolah.	Hubungi DINAS untuk pengecekan master sekolah.
Pendaftaran masih menunggu verifikasi	Sudah ada pengajuan DIAJUKAN.	Tidak perlu daftar ulang; tunggu DINAS.
Profil & Tim Teknis belum disetujui	Status profil belum DISETUJUI.	Pastikan Perencana/Pengawas lengkap dan koordinasikan dengan DINAS.
Paket belum DISETUJUI	PAGU masih DIAJUKAN/DITOLAK.	Tunggu persetujuan atau revisi PAGU usulan.
Minggu berikutnya belum dapat diajukan	Minggu sebelumnya belum DISETUJUI.	Tunggu verifikasi DINAS untuk minggu sebelumnya.
Penggunaan anggaran melebihi PAGU	Nilai laporan lebih besar dari PAGU disetujui.	Periksa nilai kumulatif/penggunaan anggaran yang dimasukkan.
GPS EXIF tidak ditemukan	Foto tidak memiliki metadata GPS.	Masukkan koordinat manual pada fallback yang ditampilkan aplikasi.

Sebelum melapor masalah teknis

Catat pesan yang muncul, NPSN, paket ID, minggu ke, dan screenshot layar. Informasi ini mempercepat pemeriksaan oleh administrator.

10

Checklist sebelum mengirim laporan

- | | |
|---|---|
| ☐ Paket pekerjaan berstatus DISETUJUI. | ☐ PAGU disetujui sudah benar. |
| ☐ Minggu sebelumnya sudah DISETUJUI (untuk minggu 2+). | ☐ Minggu yang dipilih sesuai rentang proyek. |
| ☐ Tanggal laporan sudah benar. | ☐ Target Kurva S 0-100%. |
| ☐ Realisasi fisik 0-100%. | ☐ Penggunaan anggaran tidak melebihi PAGU. |
| ☐ Foto dokumentasi jelas dan relevan. | ☐ Waktu foto EXIF terbaca atau telah diperiksa. |
| ☐ Koordinat GPS terbaca atau diisi manual. | ☐ Periksa kembali data sebelum klik Kirim Laporan. |

Selesai

Setelah dikirim, pantau notifikasi/status. Jika DISETUJUI, lanjutkan laporan minggu berikutnya. Jika DITOLAK, baca catatan DINAS, perbaiki data, lalu kirim revisi.

Ringkasan satu kalimat

Daftar → disetujui → lengkapi tim → buat paket → PAGU disetujui → lapor minggu 1 → disetujui → lanjut minggu berikutnya.

[Kembali ke sampul](#)[Daftar isi](#)

Daftar Isi Interaktif

1

Alur ringkas DINAS

Dari verifikasi akun sampai monitoring progres.

2

Login & dashboard

Akses administrator dan indikator utama.

3

Verifikasi sekolah

Setujui/tolak pendaftaran akun.

4

Manajemen User

Profil, Tim Teknis dan status administratif.

5

Verifikasi PAGU

Setujui/tolak usulan dan riwayat PAGU.

6

Verifikasi laporan

Foto, fisik, anggaran, catatan dan urutan minggu.

7

Monitoring

Dashboard, Kurva S, peta GIS dan alert.

8

Masalah umum

Validasi dan langkah penanganan.

9

Checklist operasional

Rutinitas verifikasi DINAS.

1

Alur kerja utama DINAS

Pendaftaran sekolah

Periksa NPSN/nama sekolah.



Setujui / Tolak

Persetujuan membuat akun SEKOLAH.



Tim Teknis

Pastikan
Perencana/Pengawas
lengkap.



Paket & PAGU

Tinjau usulan paket.

Verifikasi PAGU

Setujui atau tolak.



Laporan mingguan

Periksa fisik, anggaran, foto,
GPS.



Verifikasi laporan

Setujui / tolak + catatan.



Monitoring

Dashboard, Kurva S, GIS.

Prinsip pengendalian

DINAS memegang keputusan pada pendaftaran, PAGU dan laporan. Sistem mencatat notifikasi, riwayat PAGU, status verifikasi, dan jejak catatan untuk menjaga keterlacakan.

2

Login DINAS & membaca dashboard

Login

1.

Buka tab **Masuk**.
2.

Isi username administrator (mis. **admin** sesuai akun aktif).
3.


Isi password.
4.

Klik **Masuk Sistem**.

Role akun harus DINAS dan status akun harus aktif/disetujui.

Prioritas setelah masuk

- Periksa notifikasi baru.
- Lihat pendaftaran sekolah menunggu.
- Lihat PAGU usulan menunggu.
- Lihat laporan progres DIAJUKAN.
- Periksa alert keterlambatan.

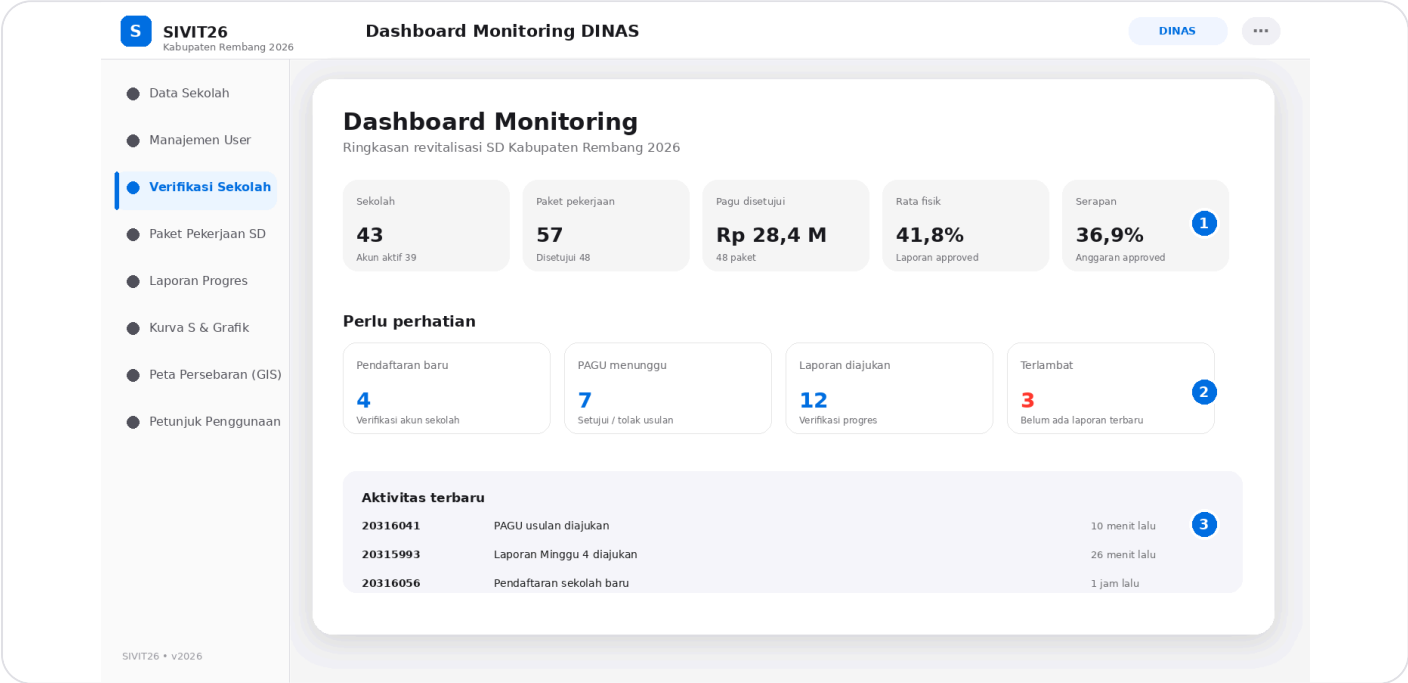

Dashboard monitoring DINAS dengan data ilustratif.

- 1 • KPI
- 2 • Alert
- 3 • Aktivitas

KPI

Jumlah sekolah, paket, PAGU disetujui, rata-rata fisik dan serapan.

Alert

Pendaftaran/PAGU/laporan menunggu dan sekolah yang perlu perhatian.

Aktivitas

Gunakan daftar aktivitas terbaru untuk menentukan prioritas verifikasi.

3 Memverifikasi pendaftaran sekolah

Verifikasi Sekolah
4 data berhasil dimuat.

NO	ID	NPSN	NAMA SEKOLAH	PASSWORD	STATUS	TANGGAL DAFTAR	AKSI
1	REG0001	20316041	SD NEGERI JAMBANGAN		JUKAN	2026-09-21	2 3
2	REG0027	20315993	SD NEGERI 1 MANGGAR		JUKAN	2026-09-24	Setujui Tolak
3	REG0028	20316056	SD NEGERI GUNUNG MULYO		JUKAN	2026-09-24	Setujui Tolak
4	REG0029	20316056	SD NEGERI GUNUNG MULYO		JUKAN	2026-09-24	Setujui Tolak

Screenshot aplikasi yang Anda kirim. Kolom password diburamkan pada panduan agar kredensial tidak ditampilkan.

- 1 • Status
- 2 • Setujui
- 3 • Tolak

- 1

Pastikan pengajuan berstatus DIAJUKAN

Periksa NPSN dan nama sekolah. Backend registrasi sudah mengambil nama dari master sekolah sehingga NPSN menjadi identitas utama.
- 2

Klik Setujui bila data benar

Persetujuan membuat/mengaktifkan akun role SEKOLAH dan sekolah dapat login dengan NPSN.
- 3

Klik Tolak bila perlu diperbaiki

Sekolah dapat mengajukan kembali pendaftaran NPSN yang sebelumnya berstatus DITOLAK.

Jangan tampilkan password pada laporan atau screenshot

Pada UI Premium V2/V3 kolom password telah disembunyikan dari tabel. Panduan ini juga memburamkan kolom tersebut pada screenshot lama.

4

Manajemen User & Tim Teknis

Setelah sekolah login dan melengkapi Perencana/Pengawas, DINAS dapat memeriksa data user. Field identitas/kredensial seperti ID, username, role, password dan last login tidak boleh diubah melalui form umum.

FIELD	DINAS	SEKOLAH
Username/NPSN	Read-only	Read-only
Password	Tidak ditampilkan dalam tabel; dikelola sistem	Tidak dapat diubah lewat form profil
Nama pengguna	Dapat diperbarui	Read-only pada form sekolah
Perencana	Dapat diperbarui	Dapat diisi
Pengawas	Dapat diperbarui	Dapat diisi
Status profil	Menentukan kelayakan membuat paket	Backend saat menyimpan profil menandai DIAJUKAN

Perhatian alur status profil

Pembuatan paket mensyaratkan profil/tim teknis berstatus DISETUJUI. Pada backend saat ini, penyimpanan profil oleh SEKOLAH mengubah status menjadi DIAJUKAN. Pastikan status administratif profil sudah DISETUJUI sebelum sekolah membuat paket. Ini perlu dijadikan SOP sampai frontend menyediakan kontrol persetujuan profil yang eksplisit.

5 Memverifikasi paket dan PAGU usulan

S

SIVIT26

Kabupaten Rembang 2026

Paket Pekerjaan SD

DINAS

...

● Data Sekolah

● Manajemen User

● Verifikasi Sekolah

● Paket Pekerjaan SD

● Laporan Progres

● Kurva S & Grafik

● Peta Persebaran (GIS)

● Petunjuk Penggunaan

Verifikasi PAGU Usulan

Tinjau paket dan tetapkan PAGU sebelum sekolah membuat laporan progres.

NPSN	PAKET	MENU	USULAN	STATUS	AKSI
20316041	PKT-...701	Rehabilitasi Ruang Kelas	Rp 1.250.000.000	DIAJUKAN 1	Setujui Tolak 2
20315993	PKT-...855	Toilet / Sanitasi	Rp 425.000.000	DISETUJUI	Riwayat
20316056	PKT-...026	Perpustakaan	Rp 680.000.000	DIAJUKAN	Setujui Tolak

Aturan

3

- Hanya paket berstatus DIAJUKAN yang dapat diverifikasi.
- Jika disetujui, PAGU = PAGU USULAN dan status menjadi DISETUJUI.
- Jika ditolak, sekolah dapat merevisi PAGU USULAN dan mengajukan kembali.

Contoh tabel verifikasi PAGU. Tombol Setujui/Tolak hanya relevan untuk status DIAJUKAN.

1 • Status

2 • Keputusan

3 • Aturan

1 Periksa paket yang berstatus DIAJUKAN

Cek NPSN, nama menu, PAGU usulan, jadwal, Perencana dan Pengawas.

2 Setujui atau Tolak

Setujui: PAGU aktif diisi dari PAGU usulan dan status menjadi DISETUJUI. **Tolak:** status menjadi DITOLAK dan sekolah dapat merevisi PAGU usulan.

3 Gunakan Riwayat PAGU

Sistem mencatat PAGU lama, PAGU baru dan keterangan setiap pengajuan/keputusan untuk audit.

Dampak persetujuan

Hanya paket dengan status PAGU DISETUJUI dan PAGU > 0 yang dapat digunakan SEKOLAH untuk membuat laporan progres.

6 Memeriksa dan memverifikasi laporan progres

SIVIT26
Kabupaten Rembang 2026

Laporan Progres

Verifikasi Laporan Progres
Periksa data mingguan, foto dokumentasi, progres fisik dan anggaran.

SD NEGERI JAMBANGAN
NPSN 20316041 • PKT-20316041-1790989701

Minggu 2 Target 18% Fisik 17.5% Anggaran Rp 210 jt DIAJUKAN

FOTO DOKUMENTAS 1

Lokasi
-6.70612, 111.34522
Waktu foto 18/10/2026 09:42

Keputusan verifikasi

STATUS
DISETUJUI 2

CATATAN DINAS
Pekerjaan sesuai; lanjutkan target minggu berikutnya. 3

Kirim Verifikasi 4

Panel verifikasi laporan dengan data contoh.

1 • Foto/GPS 2 • Status 3 • Catatan 4 • Kirim

1 Periksa bukti dokumentasi

Lihat foto, waktu pengambilan dan koordinat. Bandingkan dengan progres fisik dan konteks paket.

2 Pilih DISETUJUI atau DITOLAK

Backend hanya menerima kedua keputusan tersebut pada endpoint verifikasi laporan.

3 Isi catatan DINAS bila diperlukan

Jika laporan DITOLAK, catatan DINAS wajib diisi. Catatan disimpan bersama identitas verifikasi.

4 Kirim Verifikasi

Laporan yang sudah DISETUJUI tidak dapat diverifikasi ulang. Sekolah menerima notifikasi hasil verifikasi.

Urutan minggu tetap berlaku pada DINAS

Laporan minggu ke-2 tidak dapat DISETUJUI bila minggu sebelumnya belum DISETUJUI. Ini mencegah lompatan urutan monitoring.

Catatan pekerjaan

DINAS dapat menyimpan/mengubah

catatan_pekerjaan

melalui endpoint khusus; field lain laporan tidak boleh ditimpa lewat saveData generik.

7


Monitoring dashboard & Kurva S

Dashboard Monitoring

Gunakan KPI dan alert untuk memprioritaskan sekolah/paket yang membutuhkan verifikasi atau perhatian. Ringkasan fisik/serapan memakai data laporan yang telah disetujui sesuai logika dashboard.

Filter DINAS

Pada tabel/kurva, DINAS dapat memfilter berdasarkan NPSN dan nama menu pekerjaan agar analisis tidak mencampur paket dari sekolah berbeda.

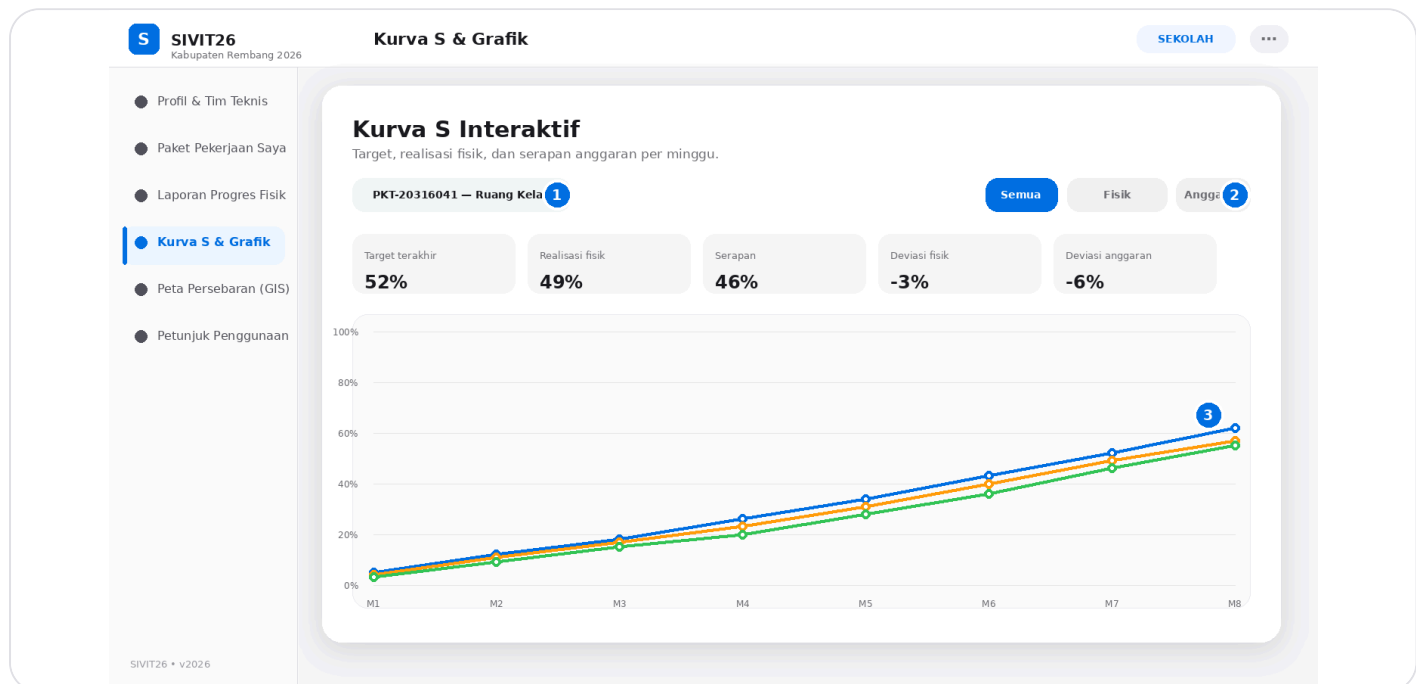

Kurva S V3 juga digunakan DINAS untuk analisis paket. Pilih satu paket agar target, fisik dan serapan dapat dibandingkan secara benar.

Pilih paket


Fokus seri

Interpretasi

Gunakan deviasi fisik dan anggaran sebagai indikator awal. Bila tertinggal, buka laporan mingguan dan bukti foto untuk analisis lebih rinci.

7B

Monitoring peta GIS

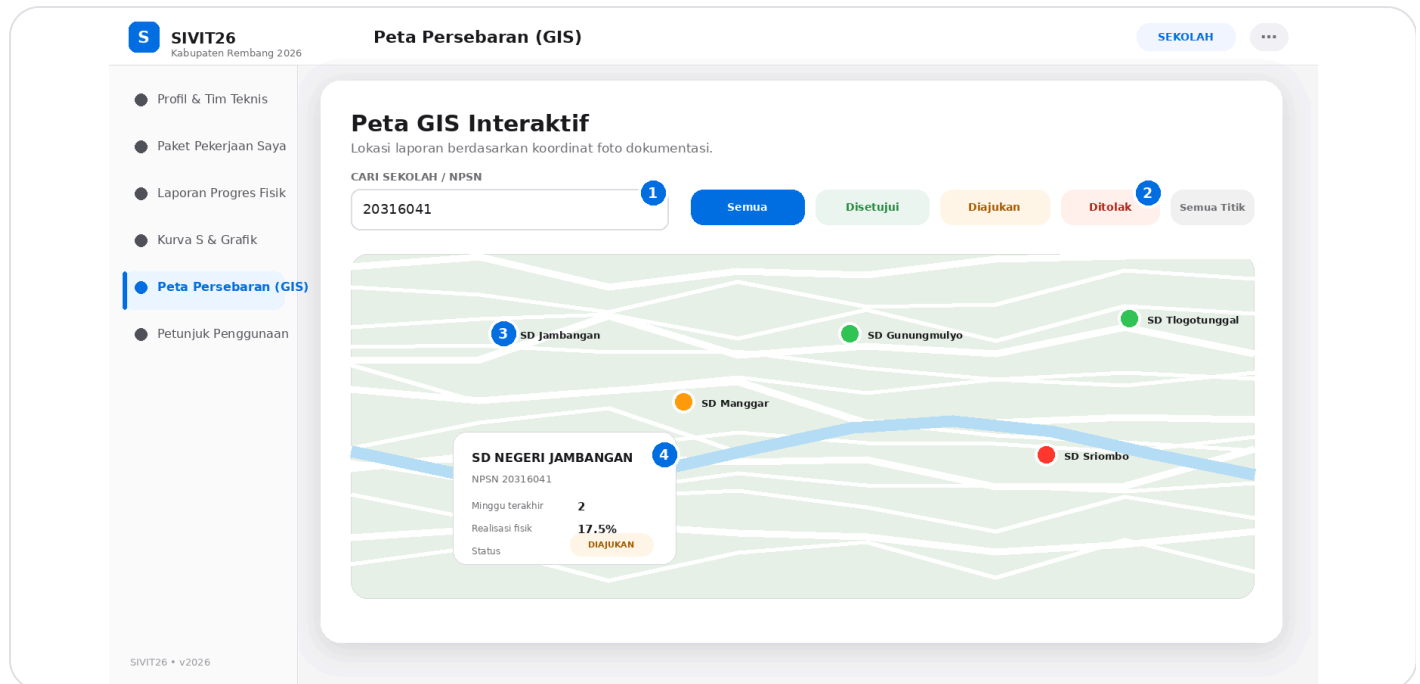

Peta GIS V3: cari sekolah/NPSN, filter status, lihat popup progres dan gunakan semua titik/fullscreen.

Cari

Filter

Popup

Gunakan filter

Saring berdasarkan status untuk melihat titik yang DIAJUKAN, DISETUJUI, atau DITOLAK.

Data koordinat

Marker bergantung pada lokasi_koordinat laporan. Jika foto tidak memiliki GPS dan koordinat manual belum diisi, titik tidak dapat dipetakan.

8

Masalah umum pada proses verifikasi

KONDISI	MAKNA	TINDAKAN DINAS
Paket bukan DIAJUKAN	Sudah disetujui/ditolak atau tidak menunggu keputusan.	Jangan verifikasi ulang; lihat status/riwayat.
PAGU usulan tidak valid	Nilai usulan kosong/0.	Minta SEKOLAH memperbaiki PAGU usulan.
Laporan minggu ke-N belum dapat disetujui	Minggu sebelumnya belum DISETUJUI.	Verifikasi minggu sebelumnya terlebih dahulu.
Catatan DINAS wajib diisi	Keputusan DITOLAK tanpa alasan.	Isi catatan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.
Laporan sudah DISETUJUI	Laporan terkunci untuk verifikasi ulang.	Gunakan mekanisme koreksi/revisi terkontrol, bukan verifikasi ulang.
Titik GIS tidak muncul	Koordinat laporan kosong/tidak valid.	Periksa metadata foto/koordinat manual pada laporan.

SOP komunikasi

Saat menolak, tulis catatan singkat tetapi spesifik: apa yang salah, data mana yang harus diperbaiki, dan tindakan yang diharapkan dari SEKOLAH.

9

Checklist verifikasi DINAS

Setiap hari / saat ada notifikasi

- | | |
|--|---|
| ☐ Cek pendaftaran sekolah berstatus DIAJUKAN. | ☐ Cocokkan NPSN dan nama sekolah. |
| ☐ Cek profil/Tim Teknis sekolah yang baru diperbarui. | ☐ Cek paket/PAGU usulan DIAJUKAN. |
| ☐ Tinjau jadwal dan nominal PAGU usulan. | ☐ Cek laporan progres DIAJUKAN. |
| ☐ Periksa urutan minggu laporan. | ☐ Periksa target dan realisasi fisik. |
| ☐ Periksa penggunaan anggaran terhadap PAGU. | ☐ Buka foto dokumentasi dan cek GPS/waktu. |
| ☐ Isi catatan DINAS saat menolak. | ☐ Pantau dashboard, Kurva S dan GIS untuk alert. |

Tujuan akhir

Setiap sekolah memiliki jejak yang konsisten: akun terverifikasi → tim teknis jelas → paket/PAGU sah → laporan mingguan berurutan → bukti foto/koordinat → verifikasi DINAS → monitoring terbaru.

[Kembali ke sampul](#)[Daftar isi](#)
